

発行日：令和7年1月20日

新山梨環狀道路通信


～12月 工事・設計・
用地測量等の進捗状況～

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。

現在、新環状道路建設事務所では、西下条ランプ(甲府市西下条町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町広瀬)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、落合西IC(甲府市落合町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町広瀬)の**東部区間 2期(L=5.5km)**の工事進捗状況ならびに設計・用地測量等の進捗状況をお伝えいたします。

～東部区間 2 期 全体概要図～

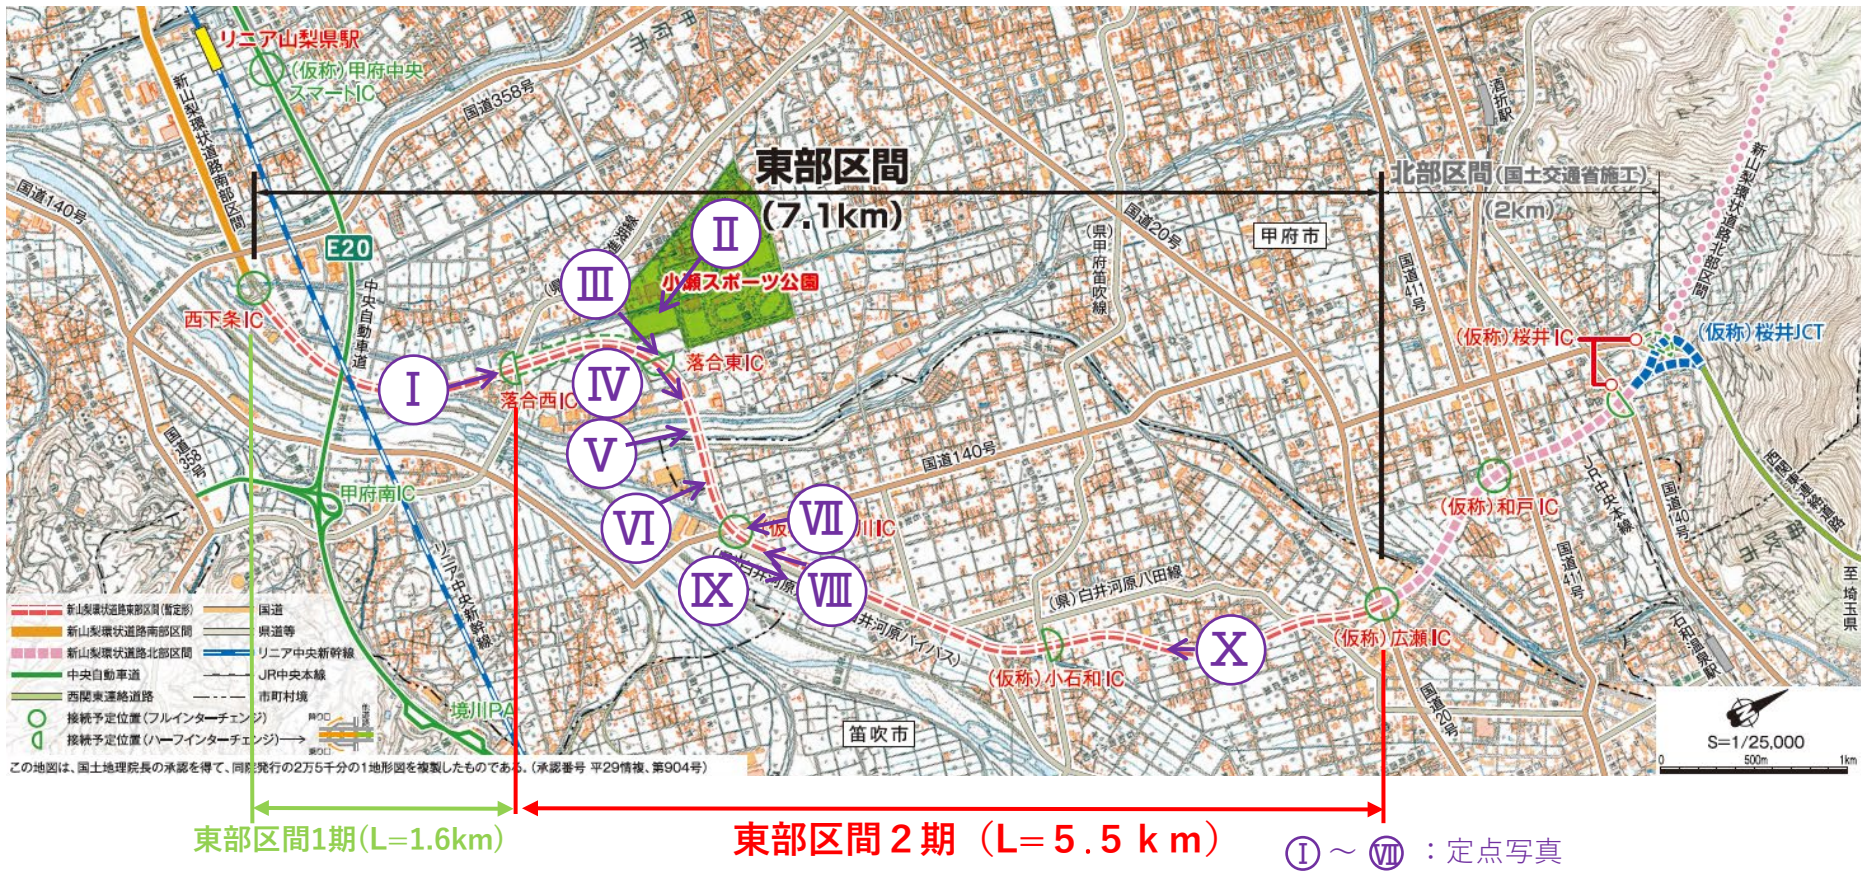

令和6年度 新山梨環状道路(東部区間2期) 工事一覧

No.	契約番号	工事名	工期	受注者	No.	契約番号	工事名	工期	受注者
①	道整22-0024	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)落合6号橋(仮称)上部工事(一部債務) 完成	R5.3.17 ~ R7.1.31	早野組・大新工業・三枝組JV	⑧	道整23-0034	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)落合3号橋(仮称)上部工事(一部債務)(余7)(補特)	R6.3.27 ~ R8.3.13	高田機工・飯田鉄工JV
②	道整22-0026	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)落合2号橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務) 完成	R5.3.17 ~ R7.1.31	飯田鉄工・榑崎製作所JV	⑨	道整24-0007	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)落合5号橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務)	R6.10.15 ~ R8.6.26	三井住友建設鉄構エンジニアリング・飯田鉄工JV
③	道整23-0006	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)落合東ランフ橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務)(余7)	R5.8.4 ~ R7.6.30	飯田鉄工	⑩	道整24-0009	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)道路工事その1(一部債務)(余7)	R6.8.26 ~ R8.2.23	芦沢組土木
④	道整23-0019	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)落合4号橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務)	R5.12.20 ~ R7.12.19	横川フリッジ・飯田鉄工JV	⑪	道整24-0010	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)道路工事その2(一部債務)	R6.9.6 ~ R8.3.15	風間興業・中村工務店JV
⑤	道整23-0020	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)東油川高架橋床版工事(一部債務)(余7)	R5.11.22 ~ R7.2.28	飯塚工業	⑫	道整24-0012	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)唐柏1号橋下部工事(一部債務)(余7)	R6.9.3 ~ R7.12.19	飯塚工業
⑥	道整23-0028	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)落合1号橋(仮称)上部工製作・架設工事(一部債務)	R6.3.22 ~ R7.11.28	飯田鉄工・榑崎製作所JV	⑬	道整24-0015	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)東油川ランフ橋下部工事(一部債務)(余7)	R6.9.3 ~ R7.6.13	友愛工業
⑦	道整23-0033	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)濁平等川大橋床版工事(一部債務)(余7)(補特)	R6.3.27 ~ R7.5.30	早野組・風間興業JV	⑭	道整24-0019	国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)道路工事(一部債務)	R6.9.7 ~ R8.3.13	早野組・望月組土木JV

※R6.12.31時点 赤字：R6.10.31時点より追加箇所

令和6年度 新山梨環状道路(東部区間 2 期) 工事一覧


No.	契約番号	工事名	工期	受注者	No.	契約番号	工事名	工期	受注者
⑮	道整 24- 0034	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）渋川第一号橋上部工製作・架設工事（一部債務）	R6.12.19 ～ R10.1.29	横川フリッジ・高田機工・飯田鉄工JV					
⑯	道整 24- 0041	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）落合2号橋床版工事（一部債務）（余7）	R6.12.10 ～ R7.9.19	長田組土木					
⑰	新環状 24- 0048	国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）道路工事（明許）（余7）	R6.10.30 ～ R7.8.29	芦沢組土木					

※R6.12.31時点 赤字：R6.10.31時点より追加箇所

～現場進捗状況写真～

令和6年12月11日撮影


I

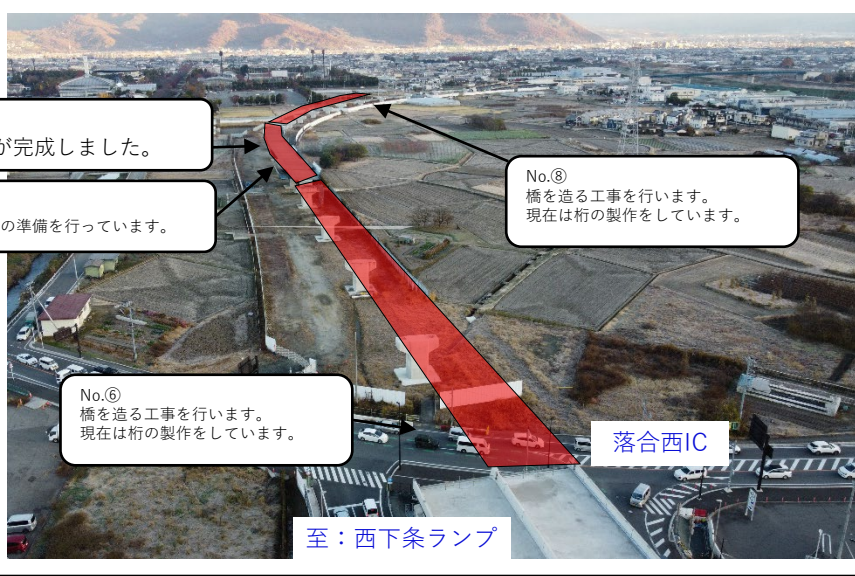

II



III

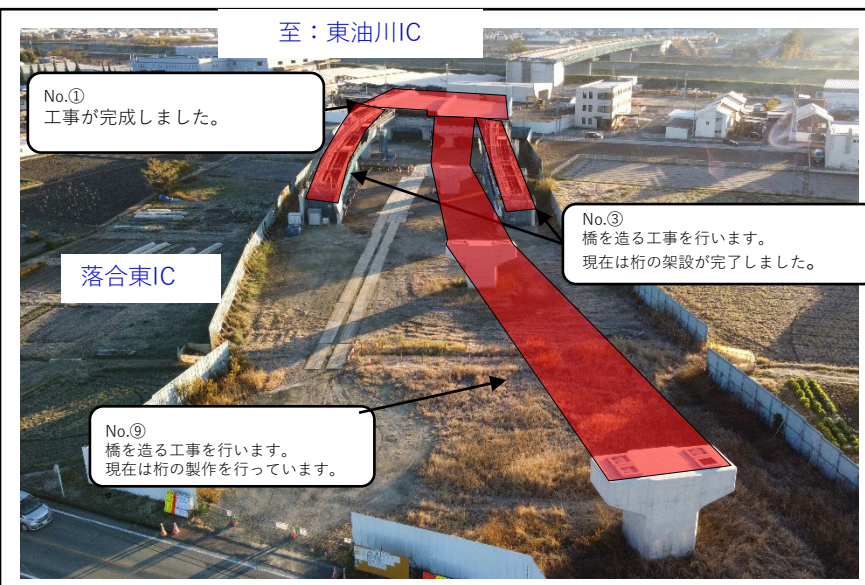

IV



～現場進捗状況写真～

令和6年12月11日撮影

V

至：落合東IC

至：東油川IC



VI

No.⑤
橋梁の上を車両が通るための工事をしています。
現在は仕上げ処理を行っています。

東油川IC



VII

No.⑩
ICを作るための盛土工事をしています。
現在は地盤改良を行っています。

東油川IC



VIII

東油川IC

No.⑮
橋を作る工事をしています。
現在は桁の製作を行っています。

No.⑬
橋台を作るための行っています。
現在は杭を打っています。

至：（仮）小石和IC



～現場進捗状況写真～

令和6年12月11日撮影

Ⅸ



Ⅹ



Ⅺ



Ⅻ



～設計・用地測量等の進捗状況～

甲府市：桜井町

【進捗状況】

- ・橋梁予備設計完了
- ・地質調査一部完了
- ・用地測量完了
- ・橋梁詳細設計完了
- ・路線測量完了
- ・用地交渉実施中

(仮)桜井JCTランプ部

※本線については国土交通省事業範囲



甲府市：落合町, 下鍛冶屋町, 白井町
 笛吹市：石和町東油川

【進捗状況】

- ・予備設計完了
- ・詳細設計完了
- ・用地測量調査完了
- ・用地交渉完了
- ・工事実施中

笛吹市：石和町井戸, 石和町砂原,
 石和町河内, 石和町小石和

【進捗状況】

- ・予備設計完了
- ・詳細設計実施中
- ・用地調査実施中
- ・用地交渉実施中

笛吹市：石和町小石和, 石和町唐柏,
 石和町広瀬

【進捗状況】

- ・側道詳細設計完了
- ・橋梁予備設計完了
- ・用地測量調査完了
- ・橋梁詳細設計実施中
- ・地質調査実施中
- ・用地交渉実施中

笛吹市：石和町広瀬

【進捗状況】

- ・側道詳細設計完了
- ・橋梁詳細設計実施中
- ・橋梁予備設計完了
- ・側道詳細設計完了
- ・用地調査実施中
- ・用地交渉実施中

◆東部区間の事業の流れ

