

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹 高架10号橋下部工事(一部債務)(余フ)(補特)

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工に当たり、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

本工事は、橋脚(高架道路を支えるコンクリート構造物)1基、水路工事220mを施工します。

令和8年6月から着手し、現在は水路工事の掘削を行っております。

工事に当たりましては、環境への配慮と安全第一で作業を進めて参ります。地域の皆様には、工事中にご不便をおかけすることもあるかと存じますが何卒ご理解ご協力をお願いいたします。



工 事 概 要： ラーメン式橋脚 N=1基、場所打杭 (φ1,500) L=35.0m N=11本

水路工 L=221m、仮設工 一式

工 期： 令和8年3月30日～令和9年9月24日

工事進捗率： 1.5%

施 工 者： 風間興業株式会社

住所 笛吹市八代町北1047-1

T E L 055-265-2353

現場代理人・監理技術者 風間 光陽



風間興業株式会社


国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹高架16号橋下部工事(一部債務)(余フ)(補特)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、皆様にはご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

本工事は令和8年6月より工事着手し、起工測量及び仮設水路工事が完了し7月中旬から橋脚の基礎となる場所打杭工事を開始する予定です。

工事期間中は、皆様にご不便やご迷惑をおかけいたしますが、安全を最優先に工事を進めてまいります。

何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

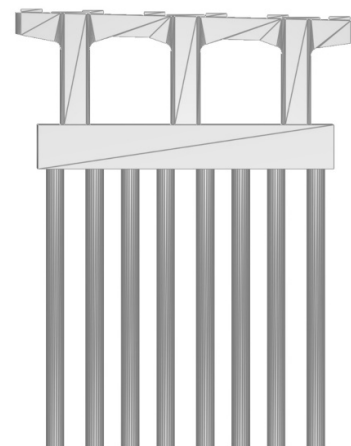

工 事 概 要 : 橋梁下部工(ラーメン式橋脚) N=1基 H=10.3m V=783m³

場所打杭工(φ1200) L=19.0m N=24本

仮設工 一式

工 期 : 令和8年3月25日 ~ 令和9年11月12日

工事進捗率 : 5.5% (令和8年6月末時点)

施 工 者 : 風間興業株式会社

現場代理人・監理技術者 木俣 隆司



風間興業株式会社


国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹高架17号橋下部工事(一部債務)(余フ)(補特)

日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、地域の皆様のご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

現在の進捗状況は、施工に向けての準備を行っております。

これから、安全第一と周辺環境に配慮した作業を行っていきます。

工事施工中にはご不便やご迷惑をお掛け致しますが、工事の無事故・無災害での早期の完成を目指してまいります。

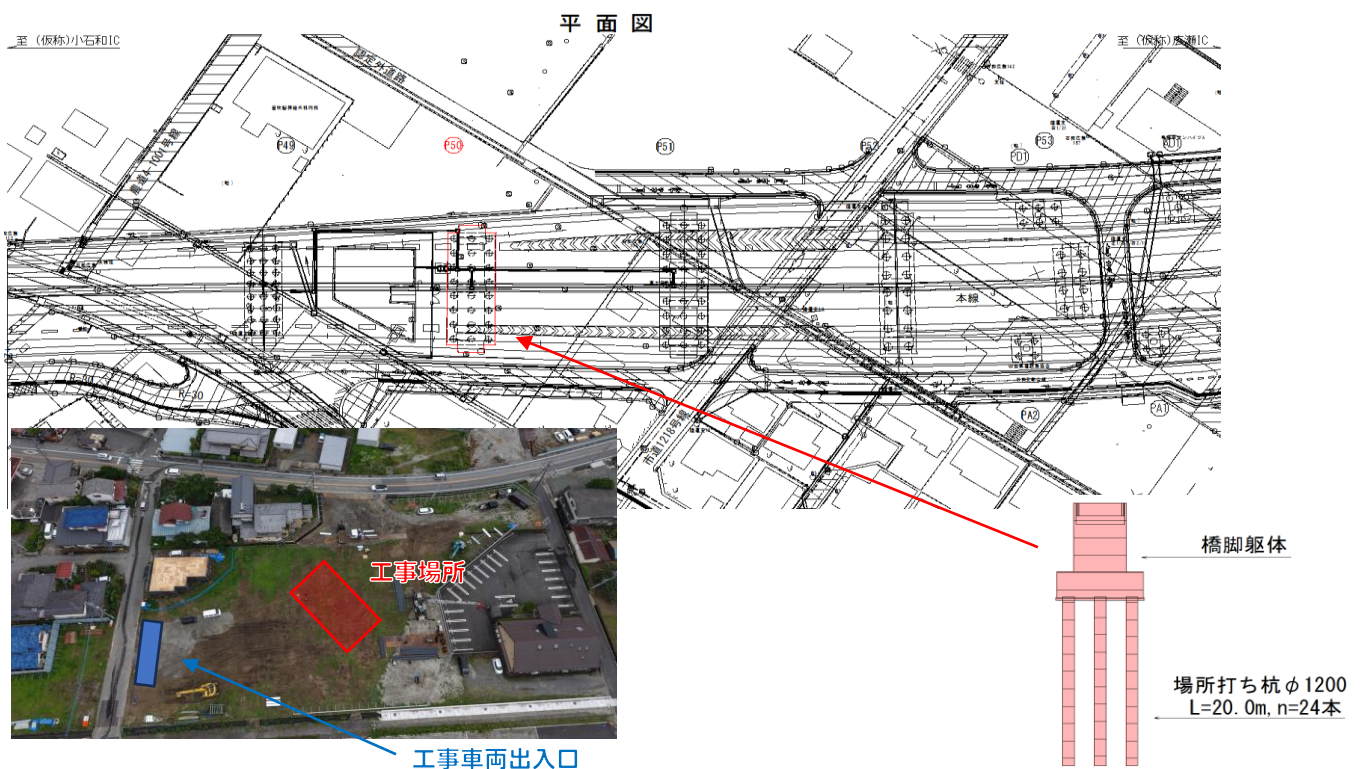

工事概要

橋梁下部工 (P50)

ラーメン式橋脚 N=1基 H=11.0m V=1060m³

場所打杭 (φ1200) L=20.0m N=24本

仮設工 1式

工期 令和 8年 3月26日～令和 9年 12月23日

工事進捗率 令和8年6月末時点 0.3%

只今工事中



現場代理人・監理技術者兼務

株式会社 飯塚工業

山下弘行



工事中につき
大変、ご迷惑を
おかけしております



道を拓く技術に創造
KK 飯塚工業

国道140号(新山梨環状道路東部区間2期)
笛吹高架18号橋下部工事その1(一部債務)(余フ)(補特)

日頃より皆様の工事へのご理解・ご協力を頂きまして、厚く御礼申し上げます。
工事に当たっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行います。
作業中ご迷惑をおかけする場合もございますので、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。



工期 自) 令和8年3月26日
至) 令和9年12月17日

橋脚工事を行うため準備を行い
7月中旬より場所打ち杭施工予定

橋梁下部工

ラーメン式橋脚 N=1基 H=12.4m

V=1,191m³

場所打杭 (φ1,500) L=17.0m N=16本

仮設工 一式

現場代理人
(監理)技術者

雨宮 利樹

工事進捗率 令和8年6月末 7.6%



株式会社 戸沢組土木

国道 140 号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹高架 18 号橋外下部工事(一部債務)(余フ)(補特)

株式会社 飯塚工業

準備工（施工計画・測量）実施中





地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事にあたり、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

この度、広瀬工区にて橋台および橋脚(合計5基)の工事を行うこととなりました。現在は準備段階で、7月より仮設工を行う予定です。

工事施工中にはご不便やご迷惑をお掛け致しますが、工事の無事故・無災害、早期の完成を目指してまいります。何卒ご協力をよろしくお願いいたします。




★現場位置図★

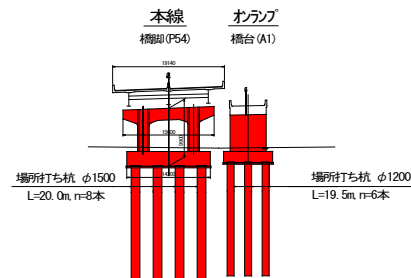

★完成予想図・一般図★

【 工事施工フロー 】

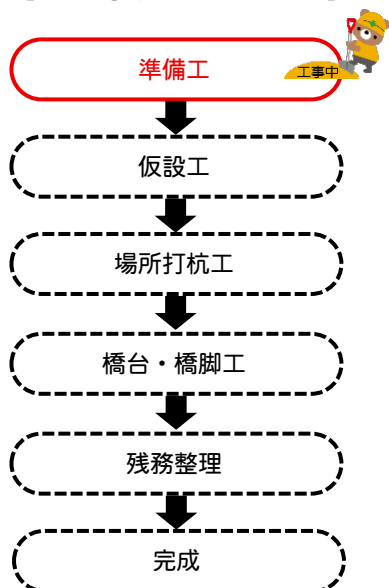

工事概要

橋梁下部工

ラーメン式橋脚 N=2 基 H=9.9~11.0m V=843m³
 逆T式橋台 N=1 基 H=8.2m V=193m³
 張出式橋脚 N=2 基 H=10.7~11.1m V=284m³
 場所打杭(φ1,500) L=19.0~21.5m N=24 本
 場所打杭(φ1,200) L=19.5m N=6 本
 仮設工 1 式

工期

令和 8 年 3 月 25 日~令和 10 年 3 月 10 日【始期 5 月 11 日】

工事進捗

1.8% (令和 8 年 6 月末)

施工者

株式会社飯塚工業 現場代理人・監理技術者 神宮司洋行




国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 笛吹高架18号橋下部工事その2(一部債務)(余フ)(補特)

平素より新山梨環状道路工事に對し、地域の皆様のご理解とご協力を
いただき厚く御礼申し上げます。

本工事は、令和8年6月より準備作業を開始し、9月上旬から場所打杭を
行うよう作業を進めております。

工事に当たりましては、環境への配慮と安全第一を図り早期完成を目指して
取り組んでまいります。地域の皆様には、ご迷惑をおかけする事もあるかと
思いますが、ご理解とご協力の程よろしく申し上げます。

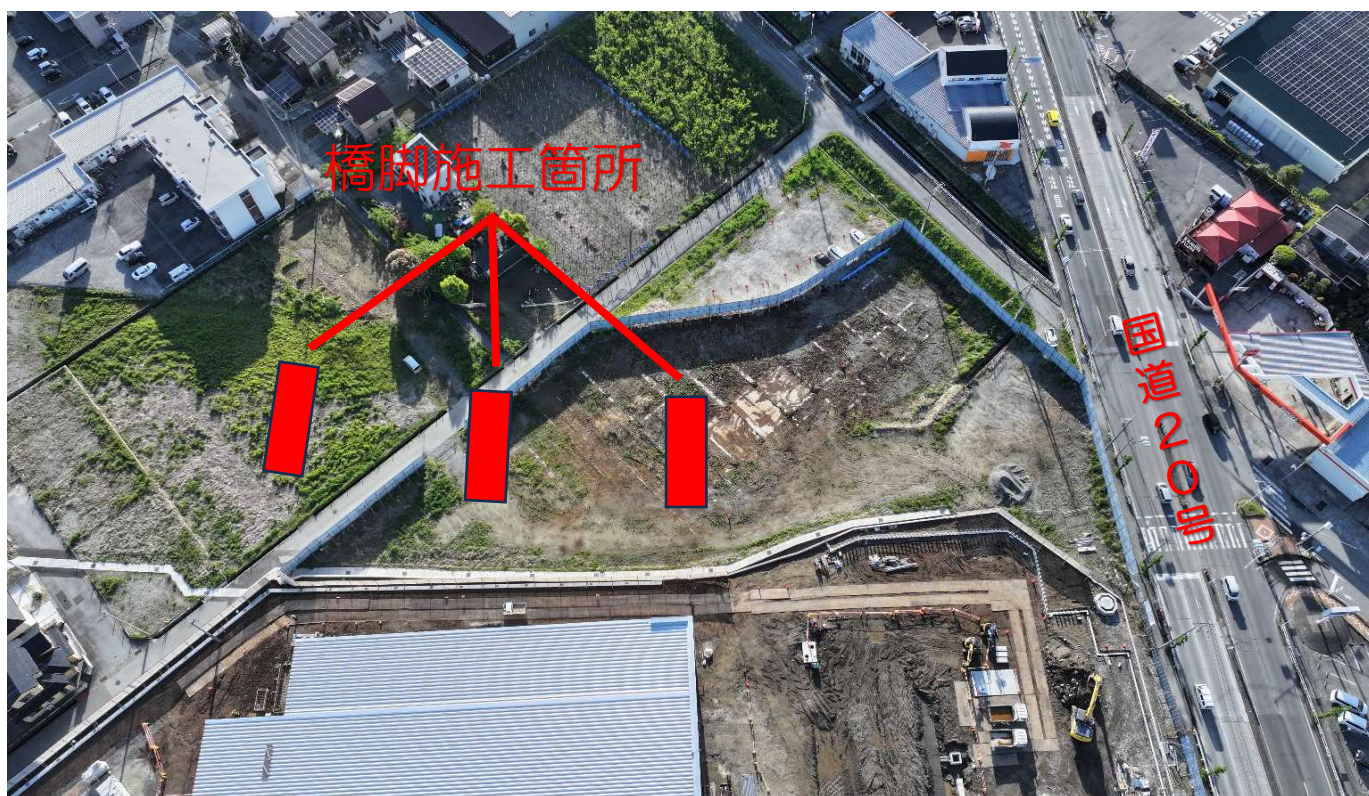

◎工事概要

○橋脚下部工

ラーメン式橋脚 N=3基 H=9.9m~10.1m

場所打杭(φ1500) L=18.0~19.5m N=24本

仮設工 1式

○工期

令和8年3月27日~令和9年12月23日

○工事進捗率

2.3% (R8.6月末時点)

◎施工者

株式会社 芦沢組土木

◎現場代理人

小田切 充

◎監理技術者

望月 万久



国道140号（新山梨環状道路東部区間2期）道路工事（一部債務）（余フ）（補特）

地域の皆様におかれましては、日頃より新山梨環状道路建設工事の施工に当たり、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

本工事は、現在 既設VSの撤去及び、新設VSの布設作業を進めております。

令和8年7月には御成橋の斫り作業も進めて参ります。

地域の皆様には、工事中にご不便をおかけすることがあるかと存じますが何卒ご協力をお願い致します。

6月末施工写真



工 事 概 要

工事概要： 道路改良工 L=228m W=12.0(15.75)m
場所打擁壁工 V=30m³ H=1.0～1.4m
排水構造物工 L=497m
橋梁用高欄工 L=47m
工 期： 令和 8年 4月 21日 ～ 令和 8年 12月 25日
工事進捗率： 令和8年6月末 17.0%
施 工 者： 友愛工業株式会社
監理技術者： 天川 裕介
