

発行日：令和2年7月16日

新山梨環状道路通信

～6月 工事現場進捗状況～


資料提供 東部1期工区安全協議会
NEXCO中日本(株)

新山梨環状道路は、甲府都市圏と周辺市町間の連結強化などを目的とした、全長約43kmの地域高規格道路です。

現在、新環状道路建設事務所では、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)広瀬IC(笛吹市石和町)までの東部区間(L=7.1km)の事業を進めています。

今回は、西下条IC(甲府市小曲町)から(仮)落合西IC(甲府市落合町)の東部区間1期(L=1.6km)の、工事の状況をお伝えいたします。

～東部区間1期 全体概要図～

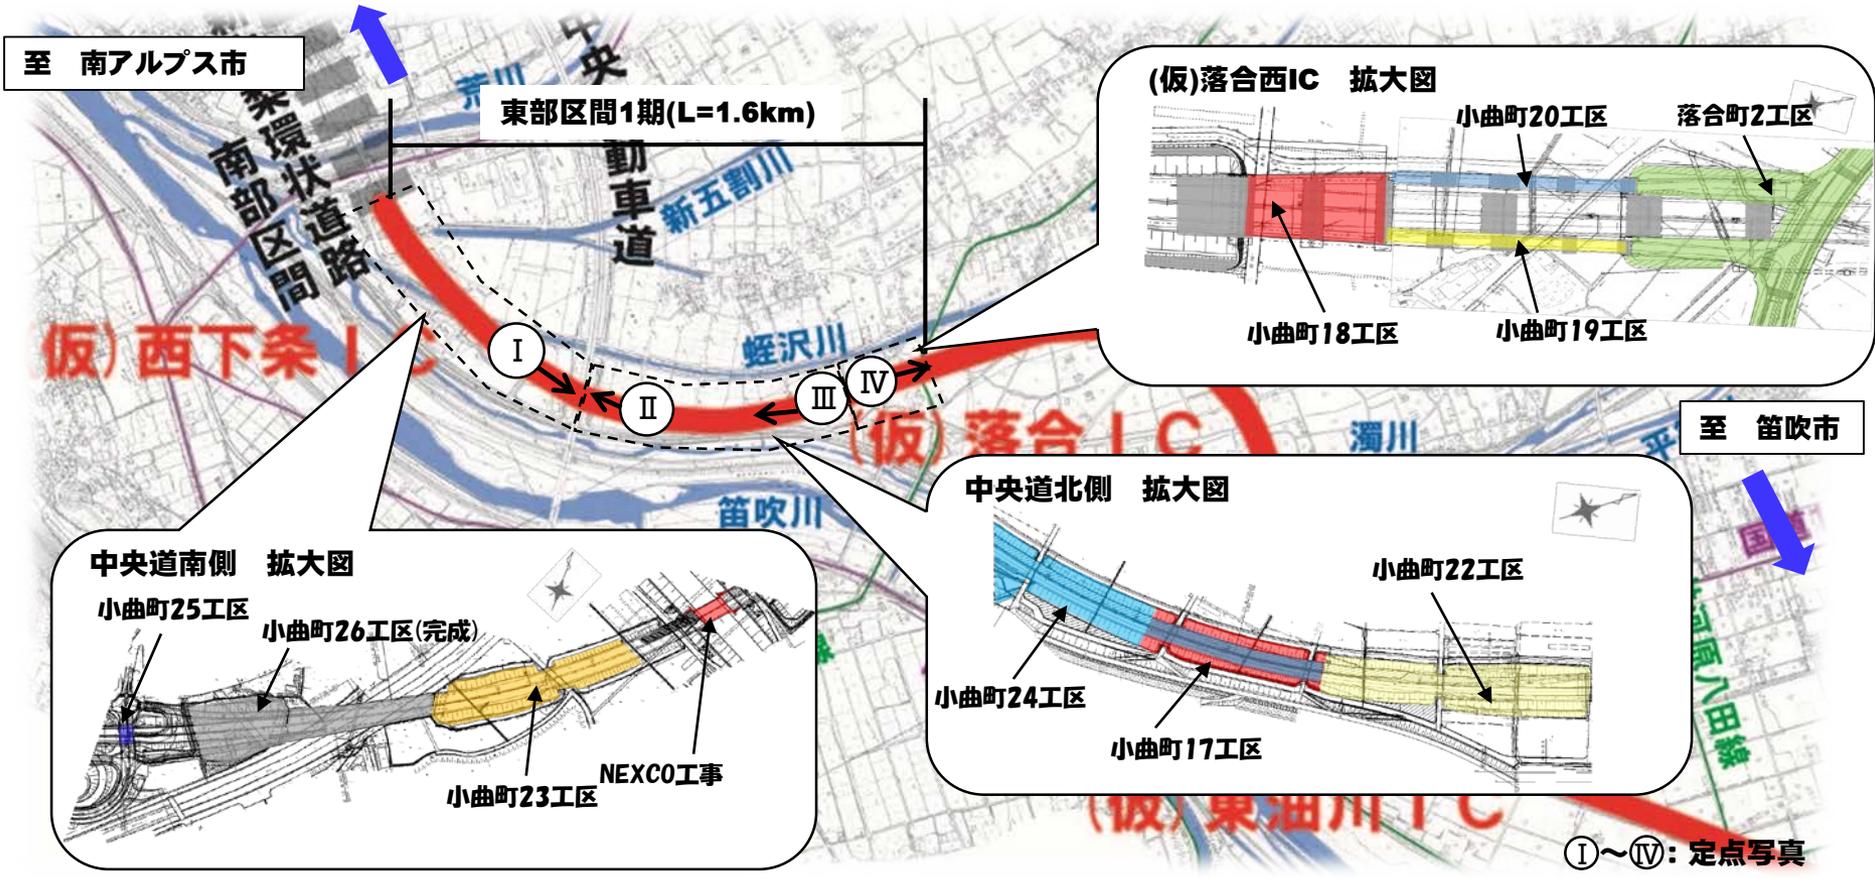

令和2年度 新山梨環状道路(東部区間1期) 工事一覧

工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者	工区番号	契約番号	工事名	工期	受注者
小曲町 17工区	道整19- 0007	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/28	大新工業 (株)	小曲町 24工区	道整19- 0038	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事その2(一部債務)	2019/12/24 ~ 2021/3/15	齋藤建設 (株)
小曲町 18工区	道整19- 0008	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 小曲高架橋(仮称)橋梁上部工製作・架設工事 (一部債務)	2019/8/28~ 2020/12/15	飯田鉄工・ 楢崎製作所 JV	小曲町 25工区	道整19- 0046	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 西下条本線橋(仮称)橋梁工事(一部債務)	2020/2/26 ~ 2021/3/15	国際建設・ 望月組土木 JV
小曲町 19工区	道整19- 0009	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 落合西オンランプ橋(仮称)橋梁上部工建設工 事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/26	(株)早野組	小曲町 26工区	環状19- 0063	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 法面植栽工事(既) 完成	2020/3/6~ 2020/7/31	中央造園土 木(株)
小曲町 20工区	道整19- 0010	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 落合西オフランプ橋(仮称)橋梁上部工建設工 事(一部債務)	2019/8/9~ 2020/8/26	(株)三枝組	落合町 2工区	道整19- 0056	国道140号(新山梨環状道路東部区間) 道路改良工事(一部債務)(余7)	2020/3/31 ~ 2021/3/15	(株)三枝組
小曲町 22工区	道整19- 0016	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事(一部債務)	2019/9/10~ 2020/11/13	長田組土木 (株)	NEXCO 工事	-	中央自動車道 甲府南地区函渠工事	2017/9/21 ~ 2020/3/27	鉄建建設 大成口テッ クJV
小曲町 23工区	道整19- 0037	国道140号(新山梨環状道路東部区間1期) 道路改良工事その1(一部債務)	2019/12/24 ~2021/1/20	(株)早野組					

注1: R2.7.16時点 赤字: 追加・変更 (R1.5.14時点より)

I

中央自動車道南側

NEXCO工事
中央道の下にトンネルを作る工事中です。
中央道下を通るトンネルが無事貫通しました。



小曲23工区
環状道路下を通るためのBOXカルバート
工事をしています。
コンクリート打設が完了し、養生をしています。

II

中央自動車道北側

小曲24工区
地盤改良工事が完了し、環状道路下を通るためのBOX
カルバート工事をしています。
現在、型枠・鉄筋の組立作業をしています。



III

(仮称)落合西ICから中央道北側方面



小曲17・22工区
盛土施工中です。
土を敷き均し、転圧する作業
を繰り返しています。

IV

(仮)落合西IC付近



小曲19・20工区
ランプ橋のコンクリートの打設が完了し、
橋梁に取り付ける付属物の設置をしています。

小曲22工区
盛土施工中です。

黒枠：将来形のルートイメージ
赤枠：工事中箇所
