リニア中央新幹線　山梨県内（富士川町最勝寺～山梨・静岡県境）
事業概要図

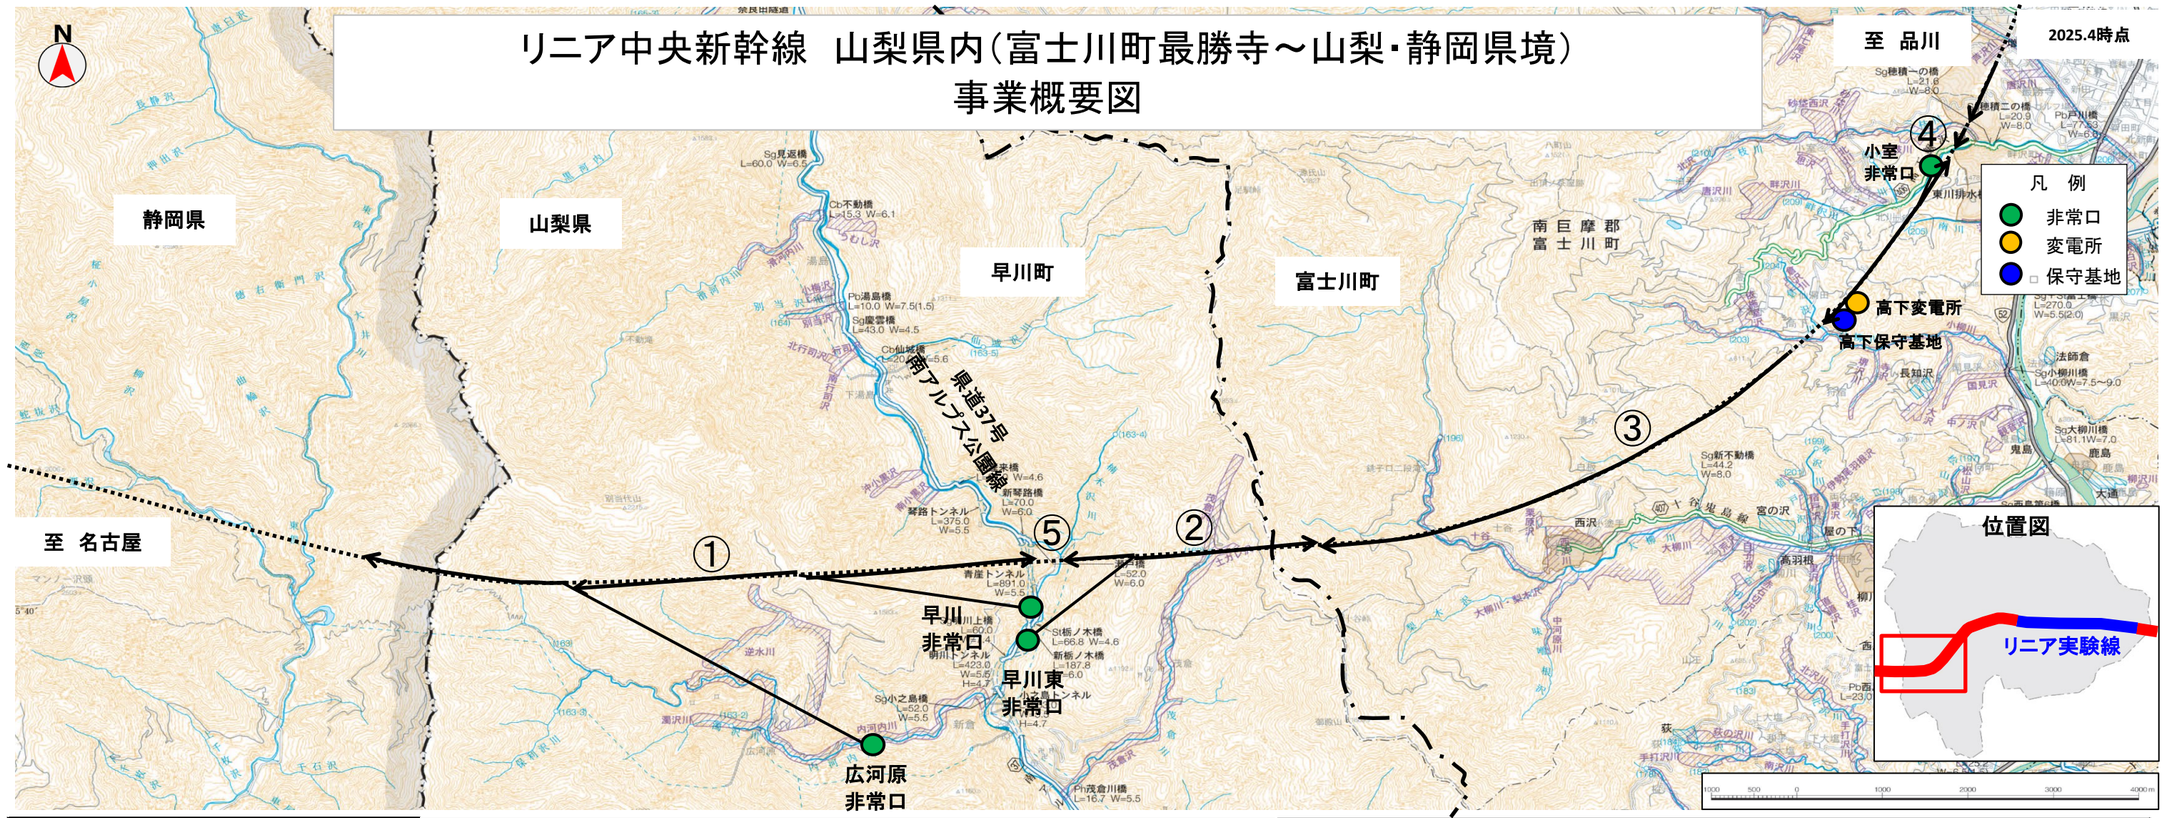





※橋りょう・トンネル等工事の後、設備等工事を予定

No.	工区名	工事概要	請負者	工期	備考
①	南アルプストンネル新設（山梨工区）	本線トンネル7.7km、早川非常口・広河原非常口等	大成建設・佐藤工業・錢高組ＪＶ	H27.8.27～ R7.10.31	（早川非常口） H29.6 斜坑掘削完了 H30.3～ 本坑掘削開始 R5.3　先進坑掘削完了 （広河原非常口） R4.8　斜坑掘削完了 R4.8～ 先進坑掘削開始
②	第四南巨摩トンネル新設（西工区）	本線トンネル2.6km、早川東非常口、保守基地連絡坑等	西松建設・青木あすなろ建設・岩田地崎建設ＪＶ	H28.7.20～ R8.5.31	（早川東非常口） R3.10　斜坑掘削完了 R3.11～ 本坑掘削開始 R5.4～　先進坑掘削開始
③	第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほか	本線トンネル6.0km、保守基地連絡坑、保守基地・変電所用地造成	大林組・鴻池組ＪＶ	R1.12.19～ R8.5.31	R3.12～ 本坑掘削開始 R3.12～ 保守基地連絡坑掘削開始
④	第三南巨摩トンネルほか新設	本線トンネル3.4km、小室非常口、本線橋梁（三枝川橋りょう約50m,畔沢川橋りょう約110m）	大成建設・早野組ＪＶ	R2.11.16～ R8.5.31	（第一南巨摩トンネル） R5.10.13 第一南巨摩ＴＮ貫通 （三枝川橋りょう） R6.1～　施工中 （畔沢川橋りょう） R6.4～　施工中 （小室非常口） R5.6～　施工中
⑤	早川橋りょうほか新設	橋梁工事（コンクリートアーチ橋、橋長400m）	大成建設・錢高組ＪＶ	R5.11.21～ R9.12.31	R5.12～　施工中

凡例

	工事	
	契約状況	工事
	未発注	未着手
	契約手続中等	実施中
	契約完了	完成
